TPP Preliminary RC Programme 18-11-13 SUMMARY

Row	Name	Start	Duration	Finish
1	**RC WALL BASES & LOW LEVEL WALLS**			
2	Wall Base No.1	25/11/13	7d	03/12/13
3	Wall Base No.2	27/11/13	9d	09/12/13
4	Wall Base No.3	29/11/13	9d	11/12/13
5	Wall Base No.4	03/12/13	9d	13/12/13
6	Low Level Wall Pour 1	04/12/13	4d	09/12/13
7	Low Level Wall Pour 3	09/12/13	5d	13/12/13
8	Low Level Wall Pour 4	10/12/13	6d	17/12/13
9	Low Level Wall Pour 5	13/12/13	5d	19/12/13
10	Low Level Wall Pour 6	17/12/13	5d	06/01/14
11	Low Level Wall Pour 7	19/12/13	5d	08/01/14
12	Low Level Wall Pour 8	06/01/14	5d	10/01/14
13	Low Level Wall Pour 9	08/01/14	6d	15/01/14
14	Low level Wall Pour 10	13/01/14	6d	20/01/14
15	Low Level Wall Pour 19	16/01/14	6d	23/01/14
16	Wall Base No.5	05/12/13	9d	17/12/13
17	Low Level Wall Pour 11	18/12/13	5d	07/01/14
18	Low Level Wall Pour 12	20/12/13	6d	10/01/14
19	Low Level Wall Pour 13	07/01/14	6d	14/01/14
20	Wall Base No.6	09/12/13	9d	19/12/13
21	Wall Base No.7	11/12/13	9d	06/01/14
22	Low Level Wall Pour 16	07/01/14	6d	14/01/14
23	Low Level Wall Pour 17	10/01/14	5d	16/01/14
24	Low Level Wall Pour 18	14/01/14	5d	20/01/14
25	Low Level Wall Pour 20	16/01/14	6d	23/01/14
26	Wall Base No.8	13/12/13	9d	08/01/14
27	Low Level Wall Pour 21	21/01/14	6d	28/01/14
28	Low Level Wall Pour 22	24/01/14	6d	31/01/14
29	Low Level Wall Pour 23	29/01/14	6d	05/02/14
30	Wall Base No.9	17/12/13	10d	13/01/14
31	Low Level Wall Pour 14	14/01/14	6d	21/01/14
32	Low Level Wall Pour 15	17/01/14	6d	24/01/14
33	Wall Base No.10	06/01/14	8d	15/01/14
34	Low Level Wall Pour 26	22/01/14	6d	29/01/14
35	Low Level Wall Pour 27	27/01/14	6d	03/02/14
36	Low Level Wall Pour 28	30/01/14	6d	06/02/14
37	Wall Base No.11	08/01/14	9d	20/01/14
38	Low Level Wall Pour 24	03/02/14	6d	10/02/14
39	Low Level Wall Pour 25	06/02/14	6d	13/02/14
40	Low Level Wall Pour 29	11/02/14	6d	18/02/14
41				
42	**UPPER WALL POURS**			
43	Upper Pour - U1	21/01/14	5d	27/01/14
44	Upper Pour - U2	23/01/14	5d	29/01/14
45	Upper Pour - U3	27/01/14	5d	31/01/14
46	Upper Pour - U4	29/01/14	5d	04/02/14
47	Upper Pour - U5	31/01/14	5d	06/02/14
48	Upper Pour - U6	04/02/14	6d	11/02/14
49	Upper Pour - U7	07/02/14	6d	14/02/14
50	Upper Pour - U8	12/02/14	6d	19/02/14
51	Upper Pour - U9	03/02/14	6d	10/02/14
52	Upper Pour - U10	06/02/14	5d	12/02/14
53	Upper Pour - U11	10/02/14	5d	14/02/14
54	Upper Pour - U12	12/02/14	5d	18/02/14
55	Upper Pour - U13	14/02/14	5d	20/02/14
56	Upper Pour - U14	18/02/14	5d	24/02/14
57	Upper Pour - U15	17/02/14	5d	21/02/14
58	Upper Pour - U16	19/02/14	5d	25/02/14
59	Upper Pour - U17	21/02/14	5d	27/02/14
60	Upper Pour - U18	25/02/14	5d	03/03/14
61	Upper Pour - U19	20/02/14	5d	26/02/14
62	Upper Pour - U20	24/02/14	5d	28/02/14
63	Upper Pour - U21	26/02/14	5d	04/03/14
64	Upper Pour - U22	28/02/14	5d	06/03/14
65	Upper Pour - U24	27/02/14	5d	05/03/14
66	Upper Pour - U23	04/03/14	5d	10/03/14
67				
68	**INTERNAL FOUNDATIONS AND SLABS**			
69	Monolithic Foundation GL 4 - 7b	20/01/14	13d	05/02/14
70	Monolithic Foundation GL 7b - 10	06/02/14	12d	21/02/14
71	Underslab Drainage	17/02/14	15d	07/03/14
72	Lower Basement Slab Works GL A2-C / 7x-14	18/02/14	12d	05/03/14
73	Lower Basement Slab Works GL C-F / 1-7x	24/02/14	12d	11/03/14
74	Lower Basement Slab Works GL C-F / 7x-14	28/02/14	12d	17/03/14
75	Lower Basement Slab Works GL F-J / 7x-14	06/03/14	12d	21/03/14
76	Lower Basement Slab Works GL F-J / 1-7x	12/03/14	12d	27/03/14
77				
78	**UPPER BASEMENT EXTENSION**			
79	GL - 1 Stepped Wall and Base	06/01/14	12d	21/01/14
80	GL - 1 Stepped Walls	20/01/14	13d	05/02/14
81	Upper Car Park GL - A Wall Bases	20/01/14	11d	03/02/14
82	Upper Car Park GL - A Walls	03/02/14	13d	19/02/14
83	Ground Slab Works - Phase 1	06/01/14	46d	10/03/14
84	GL - A3/16 Stepped Wall and Base	11/03/14	11d	25/03/14
85	Retaining Wall Adjacent GL 14 on Base 5	13/01/14	5d	17/01/14
86	GL - A3/16 Stepped Walls	24/03/14	20d	18/04/14
87	Ground Slab Works - Phase 2	07/04/14	15d	25/04/14

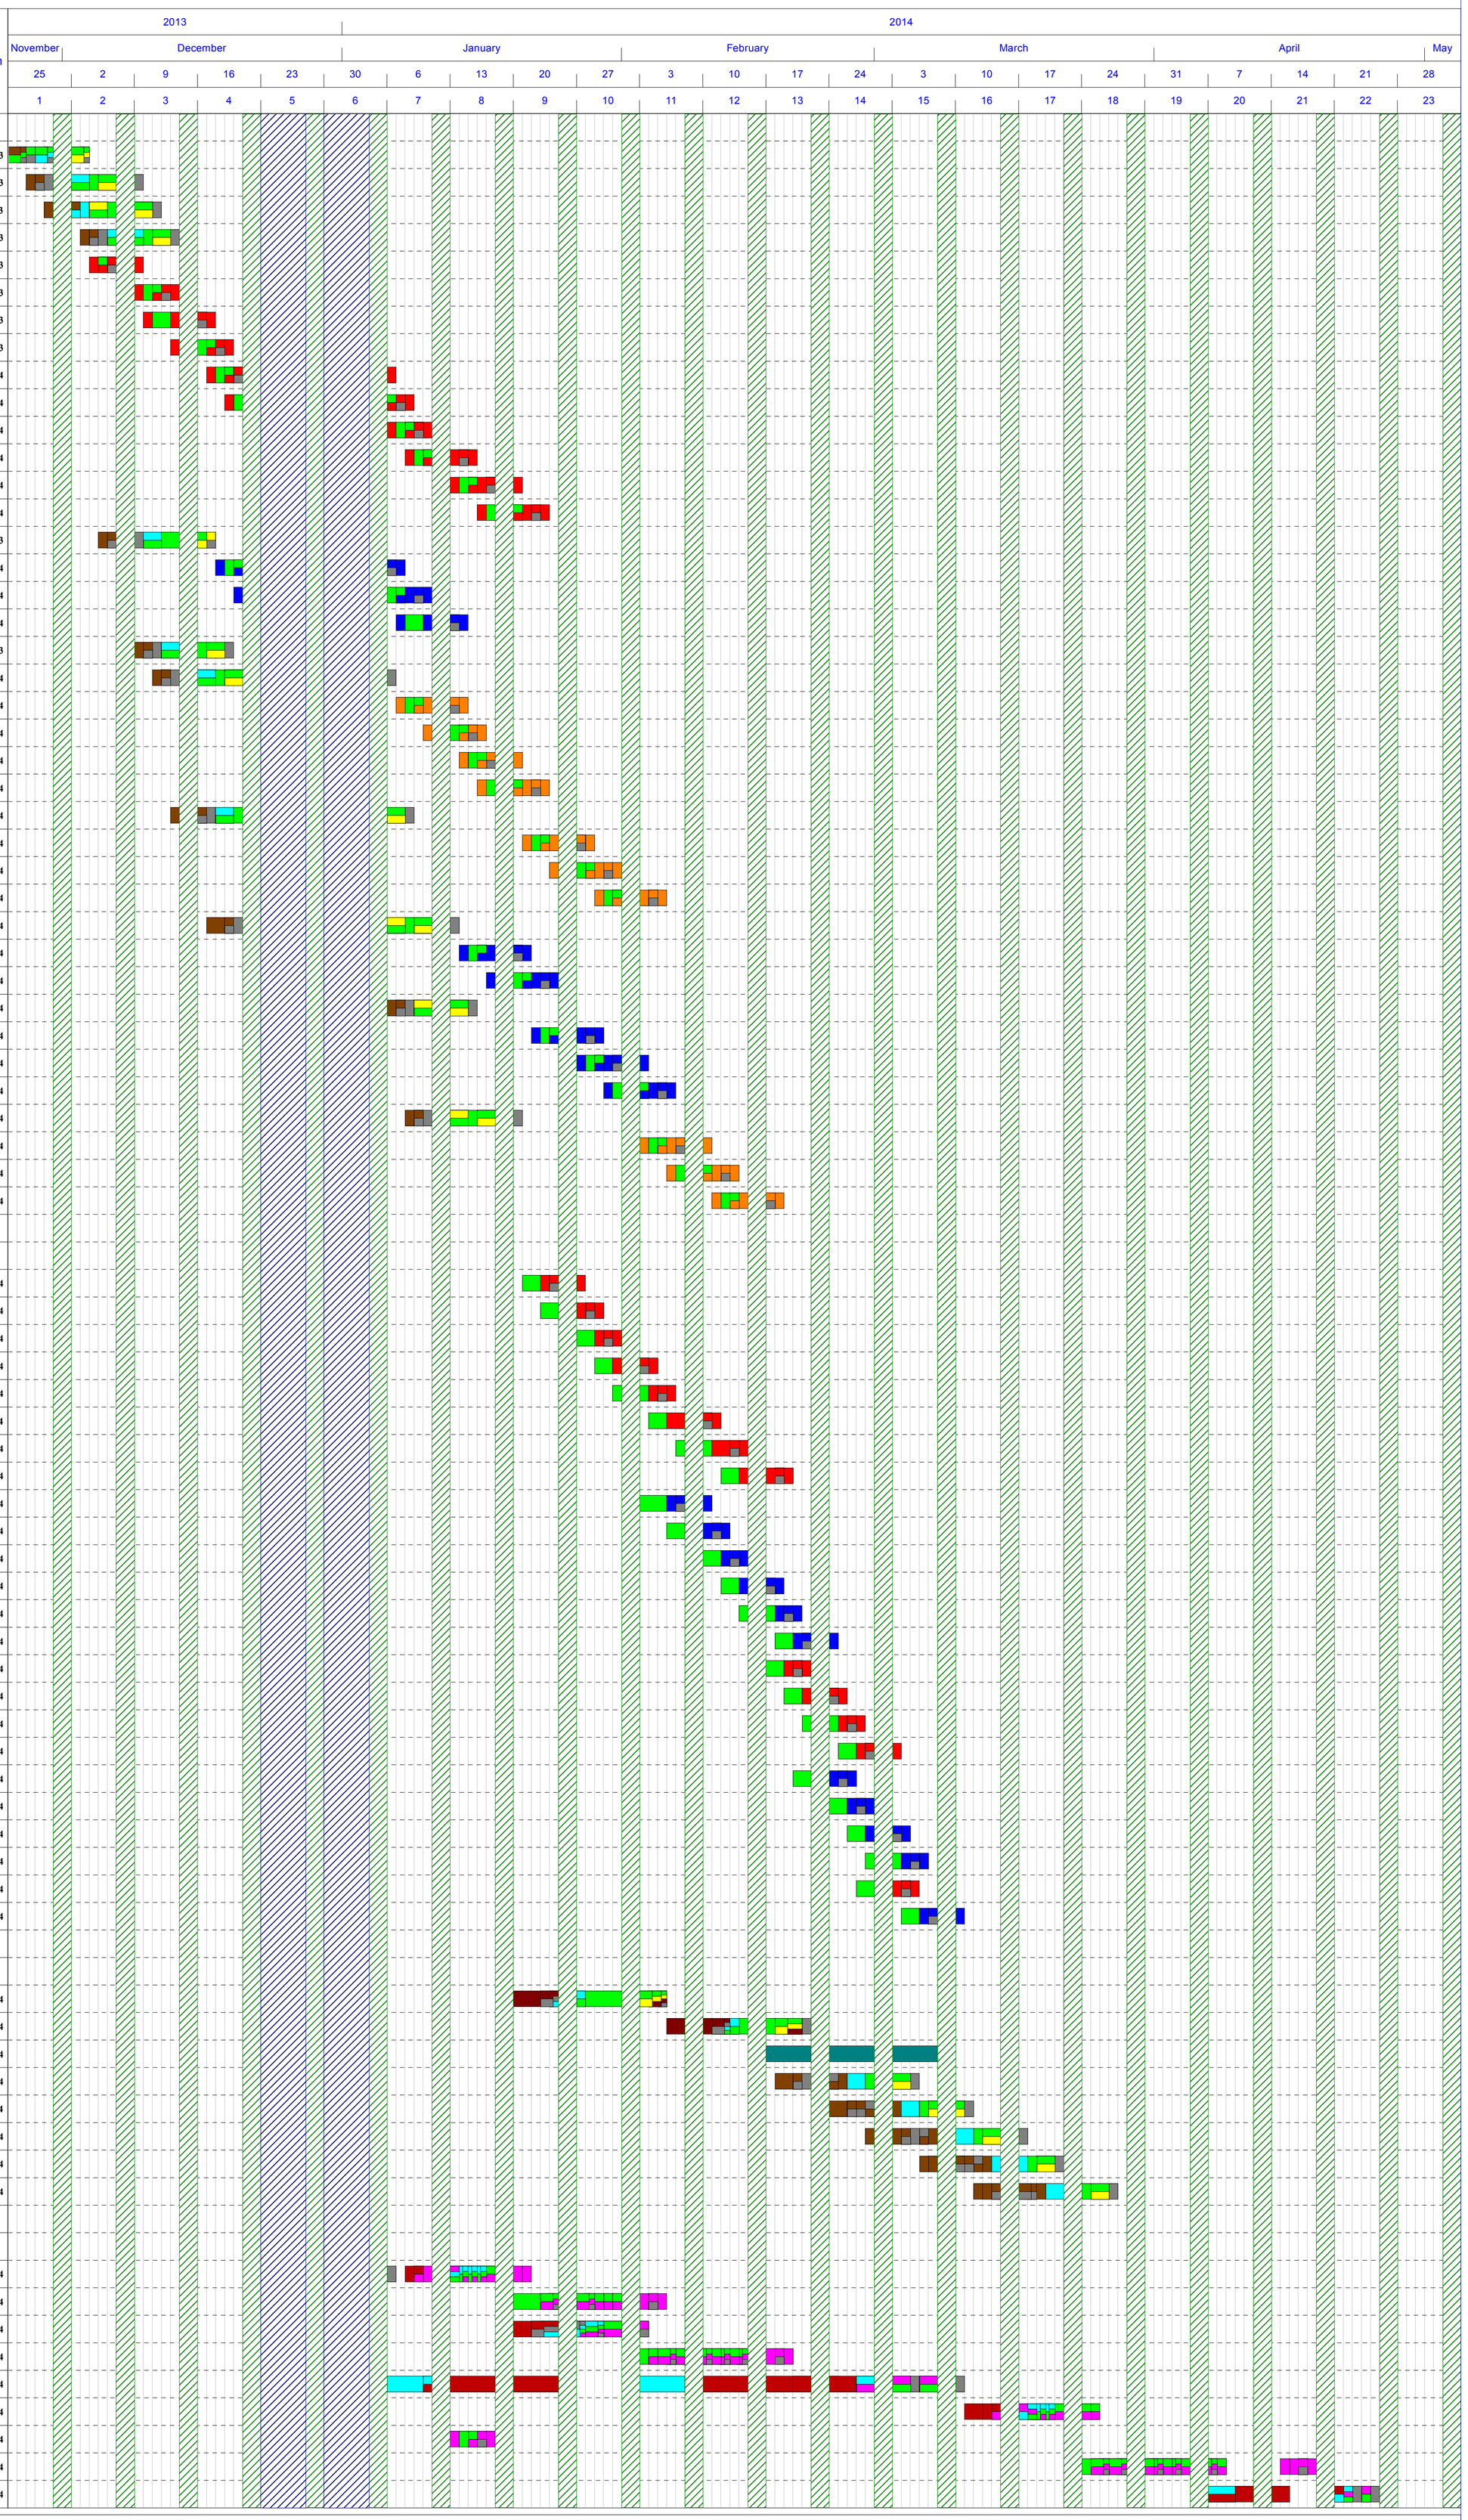

Drainage Gang
Concrete Gang
Steel Fixers
GW Gang 3
Joiner Gang 3
Joiners Gang 1
GW Gang 1
Joiner Gang 4
Joiner Gang 5
Tanking Gang
ISG
Joiner Gang 2
GW Gang 2
